Abwasserbeseitigung Gemeinde Karlskron

3. Planungs- und Ausführungstermine

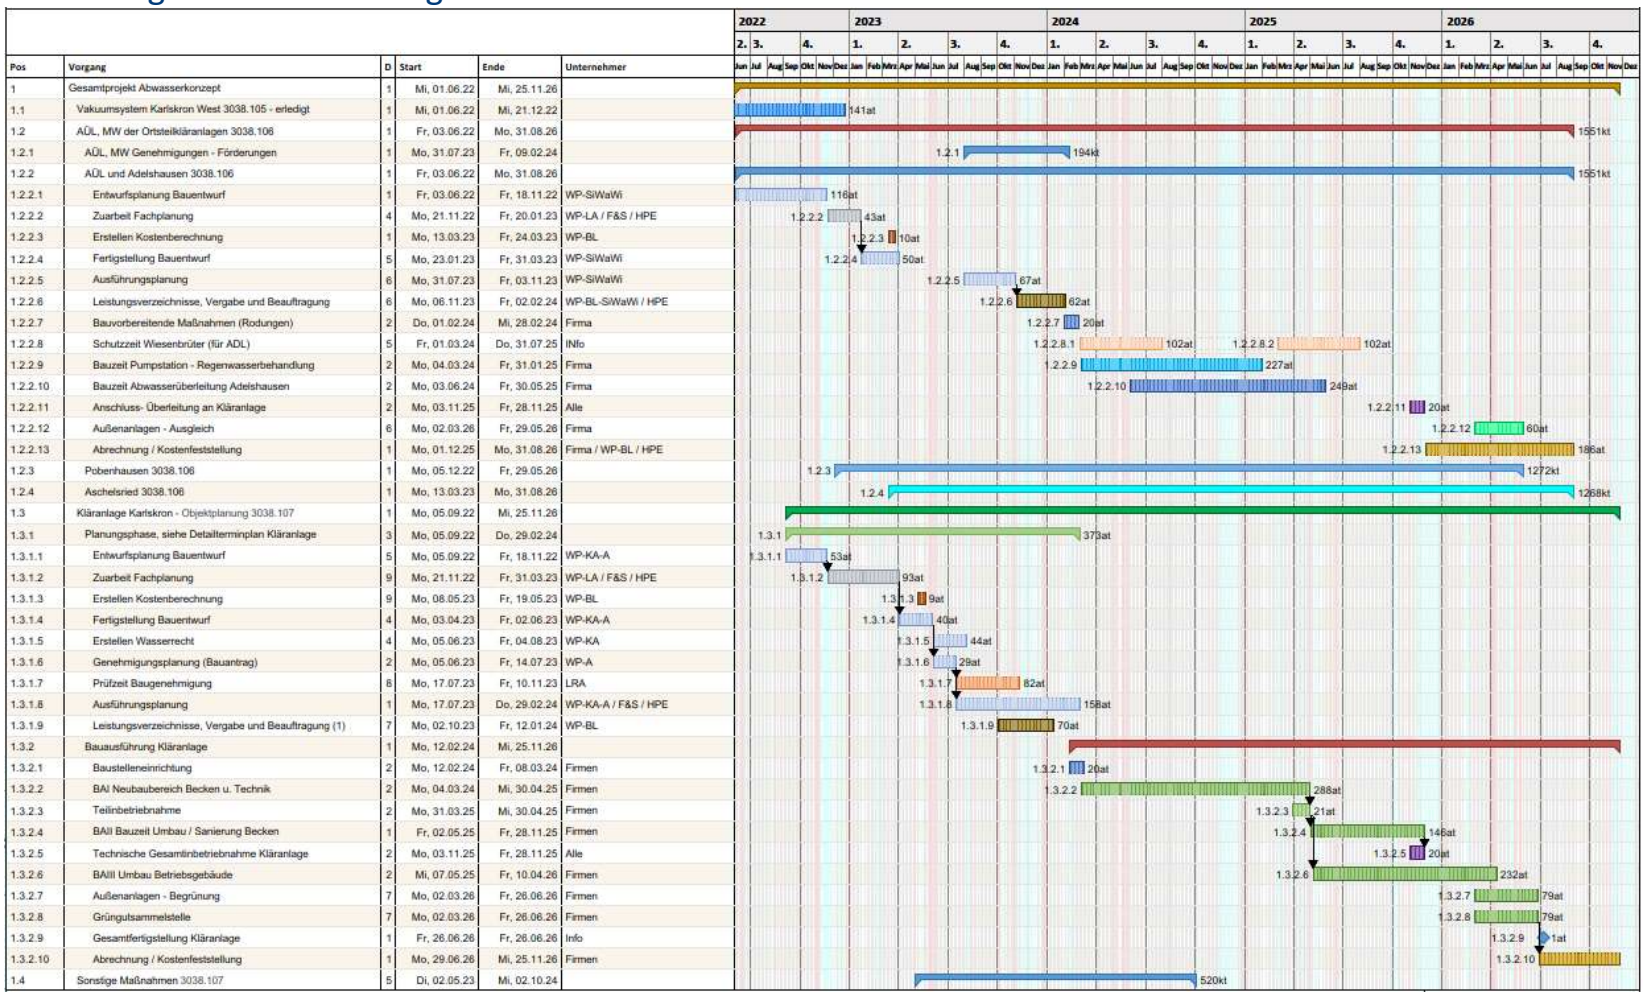

Pos	Vorgang	D	Start	Ende	Unternehmer
1	Gesamtprojekt Abwasserkonzept	1	Mi, 01.06.22	Mi, 25.11.26	
1.1	Vakuumsystem Karlskron West 3038.105 - erledigt	1	Mi, 01.06.22	Mi, 21.12.22	
1.2	AÜL, MW der Ortsteilkläranlagen 3038.106	1	Fr, 03.06.22	Mo, 31.08.26	
1.2.1	AÜL, MW Genehmigungen - Förderungen	1	Mo, 31.07.23	Fr, 09.02.24	
1.2.2	AÜL und Adelshausen 3038.106	1	Fr, 03.06.22	Mo, 31.08.26	
1.2.2.1	Entwurfsplanung Bauentwurf	1	Fr, 03.06.22	Fr, 18.11.22	WP-SiWaWi
1.2.2.2	Zuarbeit Fachplanung	4	Mo, 21.11.22	Fr, 20.01.23	WP-LA / F&S / HPE
1.2.2.3	Erstellen Kostenberechnung	1	Mo, 13.03.23	Fr, 24.03.23	WP-BL
1.2.2.4	Fertigstellung Bauentwurf	5	Mo, 23.01.23	Fr, 31.03.23	WP-SiWaWi
1.2.2.5	Ausführungsplanung	6	Mo, 31.07.23	Fr, 03.11.23	WP-SiWaWi
1.2.2.6	Leistungsverzeichnisse, Vergabe und Beauftragung	6	Mo, 06.11.23	Fr, 02.02.24	WP-BL-SiWaWi / HPE
1.2.2.7	Bauvorbereitende Maßnahmen (Rodungen)	2	Do, 01.02.24	Mi, 28.02.24	Firma
1.2.2.8	Schutzzeit Wiesenbrüter (für ADL)	5	Fr, 01.03.24	Do, 31.07.25	INfo
1.2.2.9	Bauzeit Pumpstation - Regenwasserbehandlung	2	Mo, 04.03.24	Fr, 31.01.25	Firma
1.2.2.10	Bauzeit Abwasserüberleitung Adelshausen	2	Mo, 03.06.24	Fr, 30.05.25	Firma
1.2.2.11	Anschluss- Überleitung an Kläranlage	2	Mo, 03.11.25	Fr, 28.11.25	Alle
1.2.2.12	Außenanlagen - Ausgleich	6	Mo, 02.03.26	Fr, 29.05.26	Firma
1.2.2.13	Abrechnung / Kostenfeststellung	1	Mo, 01.12.25	Mo, 31.08.26	Firma / WP-BL / HPE
1.2.3	Pobenhausen 3038.106	1	Mo, 05.12.22	Fr, 29.05.26	
1.2.4	Aschelsried 3038.106	1	Mo, 13.03.23	Mo, 31.08.26	
1.3	Kläranlage Karlskron - Objektplanung 3038.107	1	Mo, 05.09.22	Mi, 25.11.26	
1.3.1	Planungsphase, siehe Detailterminplan Kläranlage	3	Mo, 05.09.22	Do, 29.02.24	
1.3.1.1	Entwurfsplanung Bauentwurf	5	Mo, 05.09.22	Fr, 18.11.22	WP-KA-A
1.3.1.2	Zuarbeit Fachplanung	9	Mo, 21.11.22	Fr, 31.03.23	WP-LA / F&S / HPE
1.3.1.3	Erstellen Kostenberechnung	9	Mo, 08.05.23	Fr, 19.05.23	WP-BL
1.3.1.4	Fertigstellung Bauentwurf	4	Mo, 03.04.23	Fr, 02.06.23	WP-KA-A
1.3.1.5	Erstellen Wasserrecht	4	Mo, 05.06.23	Fr, 04.08.23	WP-KA
1.3.1.6	Genehmigungsplanung (Bauantrag)	2	Mo, 05.06.23	Fr, 14.07.23	WP-A
1.3.1.7	Prüfzeit Baugenehmigung	8	Mo, 17.07.23	Fr, 10.11.23	LRA
1.3.1.8	Ausführungsplanung	1	Mo, 17.07.23	Do, 29.02.24	WP-KA-A / F&S / HPE
1.3.1.9	Leistungsverzeichnisse, Vergabe und Beauftragung (1)	7	Mo, 02.10.23	Fr, 12.01.24	WP-BL
1.3.2	Bauausführung Kläranlage	1	Mo, 12.02.24	Mi, 25.11.26	
1.3.2.1	Baustelleneinrichtung	2	Mo, 12.02.24	Fr, 08.03.24	Firmen
1.3.2.2	BAI Neubaubereich Becken u. Technik	2	Mo, 04.03.24	Mi, 30.04.25	Firmen
1.3.2.3	Teilinbetriebnahme	2	Mo, 31.03.25	Mi, 30.04.25	Firmen
1.3.2.4	BAII Bauzeit Umbau / Sanierung Becken	1	Fr, 02.05.25	Fr, 28.11.25	Firmen
1.3.2.5	Technische Gesamtinbetriebnahme Kläranlage	2	Mo, 03.11.25	Fr, 28.11.25	Alle
1.3.2.6	BAIII Umbau Betriebsgebäude	2	Mi, 07.05.25	Fr, 10.04.26	Firmen
1.3.2.7	Außenanlagen - Begrünung	7	Mo, 02.03.26	Fr, 26.06.26	Firmen
1.3.2.8	Grüngutsammelstelle	7	Mo, 02.03.26	Fr, 26.06.26	Firmen
1.3.2.9	Gesamtfertigstellung Kläranlage	1	Fr, 26.06.26	Fr, 26.06.26	Info
1.3.2.10	Abrechnung / Kostenfeststellung	1	Mo, 29.06.26	Mi, 25.11.26	Firmen
1.4	Sonstige Maßnahmen 3038.107	5	Di, 02.05.23	Mi, 02.10.24	

Vakuum West in 2022 abgeschlossen

AÜL und Adelshausen

Förderanträge / Genehmigungen Anfang 2024

Ausschreibung Ende 2023

Baubeginn März 2024

Inbetriebnahme Ende 2025

Bauende Mitte 2026

Pobenhausen und Aschelsried

Bauantrag Mitte 2023

Ausschreibung Ende 2023

Baubeginn Feb. 2024

Teilinbetriebnahme April 2025

Techn. Gesamtinbetriebnahme Ende 2025

Bauende Mitte 2026
